景德镇市

2026年9月

环境监测质量状况



景德镇市生态环境局

江西省景德镇生态环境监测中心

目 录

1、饮用水源地..... 1

2、地表水.....1

3、入境断面.....2

4、环境空气.....3

5、降水.....4

6、声环境.....5

一、饮用水源地

2026 年 9 月，我中心对市区集中式饮用水源地水源进行了例行监测，监测断面设置在洋湖水厂、第四水厂、浮梁县樟树坑各自取水口的上游 100 米处。按国家规定，监测项目为《地表水环境质量标准 GB 3838-2002》中表 1 中的 24 项和表 2 中的 5 项以及表 3 中的部分常规项目，全部共 62 个项目的监测。由监测结果得知，我市市级饮用水源地（3 个）优良比例（Ⅰ～Ⅲ类）100%，各监测因子均达标。

二、地表水

地表水国控断面监测由中国环境监测总站组织开展，地表水省控断面监测按照江西省生态环境厅关于印发的《“十五五”江西省地表水生态环境质量监测断面设置方案》的要求进行监测。

本月，中国环境监测总站对昌江河南河河口、鲇鱼山和乐安河野鸡山村共 3 个国控断面以采测分离监测结果与水质自动站监测结果相结合的方式进行了评价，达标率为 66.7%。江西省景德镇生态环境监测中心对昌江河浮梁罗家村、关山村、洋湖水厂、湖田桥和乐安河桃园、韩家渡共 6 个省控断面进行了手动采样分析，达标率为 100%。各断面水质类别评价情况详见表 1。

2026 年 9 月景德镇市国控及省控地表水断面Ⅰ类水质比例为 0%，Ⅱ类水质比例为 66.7%，Ⅲ类水质比例为 22.2%，Ⅳ类水质比例为 11.1%，水质类别比例变化情况详见表 2。

表1　景德镇市2026年9月份地表水水质类别评价表

断面名称及性质		本月		上月		上年同期	
		水质类别	超标项目(超标倍数)	水质类别	超标项目(超标倍数)	水质类别	超标项目(超标倍数)
昌江河	南河河口(国控)	Ⅳ类	溶解氧	Ⅳ类	溶解氧	Ⅲ类	无
	鲇鱼山(国控)	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无
	洋湖水厂(省控)	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无
	湖田桥（省控）	Ⅲ类	无	Ⅱ类	无	/	/
	关山村(省控)	Ⅲ类	无	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无
	浮梁罗家村(省控)	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无
乐安河	野鸡山村（国控）	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无
	桃源(省控)	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无
	韩家渡(省控)	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无

备注：湖田桥断面为2026年新增省控断面。

表2　景德镇市2026年9月水质类别比例变化情况

2026年	本月				上月				变化情况			
景德镇市	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类
考核断面	0%	66.7%	22.2%	11.1%	0%	88.9%	0%	11.1%	0%	-22.2%	22.2%	0%

三、入境断面

地表水入境断面戴村为国控断面，监测由中国环境监测总站组织开展，乐平十里岗为省控断面，监测由江西省景德镇生态环境监测中心开展。2026年9月戴村水质为Ⅱ类，乐平十里岗水质为Ⅱ类，入境断面达标率为100%，景德镇市入境断面水质评价表详见表3。

表3　景德镇市2026年9月份入境断面水质类别评价表

断面名称及性质		本月		上月		上年同期	
		水质类别	超标项目（超标倍数）	水质类别	超标项目（超标倍数）	水质类别	超标项目（超标倍数）
入境断面	戴村	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无
	乐平十里岗	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无	Ⅱ类	无

四、环境空气

从本月空气质量日报和例行监测结果看，全市空气质量指标中，PM_{10}、SO_2、NO_2、CO月均浓度均达到国家空气质量Ⅰ级标准，$PM_{2.5}$、O_3月均浓度均达到国家空气质量Ⅱ级标准。景德镇市空气质量评价表详见表4。

表4　景德镇市2026年9月份空气质量评价表

项目 地点	$PM_{2.5}$（μg/m³）	PM_{10}（μg/m³）	O_3-8（μg/m³）	SO_2（μg/m³）	NO_2（μg/m³）	CO（mg/m³）
老　干	20	25	137	4	8	0.9
兽医站	20	39	142	4	7	1
陶研所	20	25	135	4	7	1
青少年活动中心	21	30	138	8	9	0.9
全市平均	（全市月均值通过每日均值计算，王岗中学作为环境空气质量背景点不参与计算）					
2025年9月	16	26	114	7	10	0.9
2026年9月	20	30	138	5	8	0.9
一级标准	15	30	100	20	40	4
二级标准	30	60	160	60	40	4

本月优良天数比率为100%，同上月持平。与上年同期相比，全市 $PM_{2.5}$、PM_{10}、O_3浓度均有所上升，SO_2、NO_2浓度均有所下降，

CO 浓度无变化，空气质量对比图详见图 1。

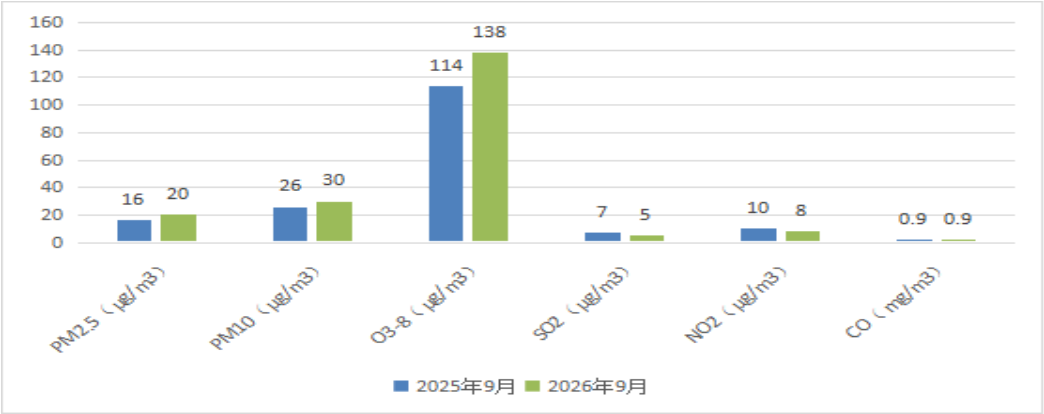


图 1　我市 2025 年 9 月与 2026 年 9 月空气质量对比图

五、声环境

2025 年起，景德镇市对 7 个功能区声环境质量监测点位开展了自动监测。2026 年 9 月全市功能区声环境自动监测点位质量评价结果见表 5：

表 5　2026 年 9 月景德镇市功能区声环境自动监测点位质量评价表

点位名称	声环境功能区	昼间达标率（%）	昼间环比变化（百分点)	昼间同比变化（百分点)	夜间达标率（%）	夜间环比变化（百分点）	夜间同比变化（百分点）
昌江区西郊街道	1 类	93.3	-2.4	13.3	96.6	-3.4	-0.1
珠山区里村街道	2 类	100	0	3.7	50.0	32.1	-42.9
珠山区新村街道	2 类	56.7	-1.4	-40	89.7	48.3	-7
昌江区新枫街道	2 类	100	77.4	3.3	96.6	-3.4	-0.1
珠山区新厂街道	2 类	100	3.2	6.7	100	3.2	6.7
昌江区高新区	3 类	100	0	0	100	0	0
景兴大道	4a 类	100	0	3.3	100	0	13.3
全市		92.8	11.9	-1.5	90.9	10.7	-3.4

备注：功能区声环境自动监测数据来源于 2026 年 10 月 9 日江西省声环境质量管理平台导出数据

2026 年 9 月，全市 7 个功能区声环境自动监测点位昼间达标为 92.8%，环比上升了 11.9 个百分点，同比下降了 1.5 个百分点。全市 7 个功能区声环境自动监测点位夜间达标率为 90.9%，环比上升了 10.7 个百分点，同比下降了 3.4 个百分点。

六、降水

2026 年 9 月全市降水 0 次，样品个数 0 个。详见表 6：

表 6　2025 年 9 月与 2026 年 9 月降水监测比较表

时间	样品个数	pH 最大值	pH 最小值	酸雨频率(%)
2025 年 9 月	11	6.3	5.5	9.1
2026 年 9 月	0	/	/	/

2026 年 10 月 9 日

资料截止日期：二〇二六年八月三十一日
